



معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

شهادة اعتماد محطه



يشهد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء

معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة

بأن محطة خلط الخرسانة الخاصة بـ

كونكريت للتجارة والمقاولات

مشروع ذا ميدان زهراء مدينة نصر

قد حققت اشتراطات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة



للتأكد من صحة
الشهادة يرجى مسح
الرمز المرفق

بدرجة (94 %) Class A

وتصلح المحطة لإنتاج خرسانة ذات مقاومة ضغط مميزة حتى ٥٠٠ كجم/سم^٣ بمحتوى أسمنت ٤٦٠ كجم/م^٣

ويجب على استشاري المحطة تحديد هامش الامان لمقاومة الضغط المذكورة طبقاً لجدول رقم ٣٠-٢ وبند ٢-٣-٤-٢ بالكود المصري

لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ مع الالتزام الكامل بنسب مكونات الخلطة الواردة بالتقرير الفني المرفق

على أن تلتزم المحطة باشتراطات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ من حيث جودة المواد واعتماد مصادرها ودورية الاختبارات وتوفير متطلبات ضبط الجودة الداخلية والخارجية وكذلك اشتراطات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة لسنة ٢٠٠٧ مع مراعاة الملاحظات الموضحة بهذه الشهادة

٢ مايو ٢٠٢٧

٣ مايو ٢٠٢٦

تاريخ انتهاء الشهادة

تاريخ إصدار الشهادة

* يجب التحقق من مدى النشاط القلوي للركام من خلال إجراء التحليل البتروجرافي وتحليل الاشعة السينية المتفرقة. ويجب أن يشمل تقرير الاختبار نسب المركبات والأكاسيد المختلفة. ويتم الرجوع للاستشاري لتقييم هذه النتائج لتحديد ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء الاختبارات الواردة بجدول (٢-١٤) لحالات التفاعل القلوي السيليسي وجدول (٢-٤ب) لحالات التفاعل القلوي الكربوناتي بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.

* التقرير الفني جزء لا يتجزأ من الشهادة.

* تسري هذه الشهادة فقط في حالة استخدام أسمنت مطابق لمتطلبات الكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ من حيث النوع والرتبة.

* يجب تطبيق احتياطات الكود نظراً لزيادة محتوى الأسمنت في الخلطة الخرسانية عن الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.

* يراعى توفير مبرد لمياه الخلط في حالة الحاجة.

* تسري هذه الشهادة فقط في حالة إجراء الاختبارات الدورية على المواد المستخدمة والخرسانة المنتجة طبقاً لجدول (٢-٨) بالكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ وكذلك تقديم التقارير المعدة بمعرفة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة.


رئيس مجلس الإدارة

مدير المعهد

أ.د. محمد مسعود السعداوي

أ.د.

شهادة رقم: ٢٠٢٦/١٤٩



السادة / محطة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلى خطاب سيادتكم الوارد للمركز بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ بخصوص طلب تقييم اعتماد محطة

خط الخرسانه الخاصة بمحطة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر

وحيث تم سداد التكاليف المطلوبة بموجب القسيمة رقم ٠٠٠٩٤٤٦ بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧.

نحيط سيادتكم علماً بأن اللجنة المشكلة لتقييم واعتماد المحطة قد انتهت من إعداد التقرير

مرفق طيه التقرير المطلوب والشهادة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

رئيس اللجنة

أ.د. إبراهيم عيسى

مدير المشروع

أ.د. 

نائب رئيس مجلس الإدارة
لشئون أعضاء هيئة البحوث

أ.د. 

أ.د. احمد عبدالحليم الجابري

تقرير فني عن تقييم واعتماد

محطة خلط

شركة كونكريت للتجارة والمقاولات

مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر

محتويات التقرير

١. مقدمة

٢. معاينة محطة الخلط على الطبيعة

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

٣.٢ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

٣.٣ الأسمنت: اختبارات الصلابة (الخواص الطبيعية والميكانيكية)

٣.٤ الماء: اختبارات الصلابة (الخواص الكيميائية)

٤. نتائج معايرة موازين محطة الخلط

٥. نتائج التحقق من كفاءة الخلط

٥.١ طريقة أخذ عينات الخرسانة

٥.٢ نتائج اختبارات التجانس

٥.٣ نتائج مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم

٦. نتائج معايرة ماكينة الضغط

٧. الخلاصة والتوصيات

المرفقات

• مرفق رقم (١): نتائج اختبارات المواد

• مرفق رقم (٢): نتائج معايرة موازين محطة الخلط

• مرفق رقم (٣): نتائج معايرة ماكينة الضغط

• مرفق رقم (٤): قائمة تقييم واعتماد محطة الخلط

إبراهيم



١. مقدمة

أعد هذا التقرير بناءً على خطاب محطة خلط خاصة بشركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر بتاريخ ٢٠٢٦/٣/١٧ وتنفيذاً لقرار السيد الأستاذ الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (٤٤٥) لسنة ٢٠١٥ بشأن قيام معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بتقييم واعتماد كفاءة محطات خلط الخرسانة طبقاً للمواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧.

حيث تم تشكيل لجنة من معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة تضم كلاً من:

أ.د/ إسراء إمام

م/ إسراء السيد

ويوضح هذا التقرير نتائج أعمال التقييم وموقف محطة الخلط من الاعتماد.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يسري فقط لمدة عام من تاريخ صدوره ويعتبر سارياً فقط في حالة التزام الشركة بكافة التوصيات الواردة بنهاية التقرير وكذلك الالتزام بتقديم تقارير الاختبارات الدورية الصادرة عن المعهد للمواد المستخدمة بالمحطة والخرسانة المنتجة وأن تفي تلك المواد بمتطلبات المواصفات القياسية المصرية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥. وهذا التقرير لا يشمل تقييم كفاءة سيارات نقل الخرسانة.

٢. معاينة محطة الخلط على الطبيعة

أجريت المعاينة على الطبيعة للمحطة بتاريخ ٢٠٢٦/٤/٢٢ و ٢٠٢٦/٥/٣ حيث أجريت أعمال الفحص البصري للمواد المستخدمة بالمحطة وسحب عينات منها لاختبارها بمعامل المركز. ويوضح المرفق رقم (١) نتائج الاختبارات المعملية للعينات المسحوبة من المواد.

وقد قامت اللجنة بمعاينة أماكن وطريقة تشوين المواد المختلفة المستخدمة وكذلك معمل المحطة (صور أرقام ١، ٢، ٣، ٤، ٥) ومعايرة الموازين ومعايرة ماكينة الضغط المتواجدة بمعمل المحطة. كما تم إجراء اختبارات تجانس الخلطة الخرسانية المنتجة من المحطة أثناء المعاينة. وتبين للجنة أن المحطة تعمل بالنظام الأوتوماتيكي مع إمكانية التحكم اليدوي.



أ.د. إسراء إمام

أ.د. إسراء السيد

١- المواد والتشويقات:

- 11/1/12

M.O.A. براد، اہل آملی

٣. نتائج اختبارات المواد

٣.١ الركام الكبير: الخواص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الميكانيكية والفيزيائية على الركام الكبير طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-2,3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي أجريت على الركام الكبير بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للامتصاص

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلس)

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

- التفاعل القلوي السيليسي والفحص البتروجرافى

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

○ منحنى التدرج الحبيبي للعيينة مقاس سن ١ يقع معظمه داخل حدود الرتبة الأساسية Gc90/15 وحدود الرتبة الإضافية GT15 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620/2002.

○ منحنى التدرج الحبيبي للعيينة مقاس سن ٢ يقع جزء منه داخل حدود الرتبة الأساسية Gc85/20 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620/2002.

○ قيم الوزن النوعي والوزن الحجمي للعينات المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الكبير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.

○ النسبة المئوية للامتصاص للعينات المختبرة تفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.

○ النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.



١٢/٤/٢٠٢٦

١٢/٤/٢٠٢٦

- مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس أنجلوس) للعيينة المختبرة (مقاس سن ١) تفي بحدود الكود.
- نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات تفي بحدود الكود.
- التفاعل القلوي السيليسي يفي بحدود الكود.
- يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للركام الكبير تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ من حيث الاختبارات الميكانيكية واختباري محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات. مع مراعاة دورية إجراء اختبارات صلاحية للركام بالمحجر طبقاً لجدول ٨-٢ بالباب الثامن بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.
- تسري شهادة الاعتماد الصادرة لهذه المحطة فقط في حالة تقديم المحطة المستندات التي تفيد بإجراء اختبار النشاط القلوي (السيليسي والكربونات) للركام قبل التوريد للمحطة.

٢.٣ الركام الصغير: الخواص الفيزيائية والكيميائية

أجريت الاختبارات الفيزيائية على الركام الصغير (الرمل) طبقاً للمواصفات الأوروبية (EN 933-1) وكذلك (EN 1097-3,6) والاختبارات الكيميائية طبقاً للمواصفات القياسية الأوروبية رقم (EN 1744-1) ومقارنة النتائج بحدود المواصفات الأوروبية والكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥. وفيما يلي بيان بالاختبارات التي تم إجراؤها على الرمل بمعامل المركز:

- التدرج الحبيبي

- الوزن النوعي

- الوزن الحجمي

- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة

- تعيين نسبة أملاح الكلوريدات والكبريتات

وقد أوضحت نتائج الاختبارات الواردة بالمرفق رقم (١) ما يلي:

- منحنى التدرج الحبيبي يقع داخل حدود رتبة G_s85 للتدرج طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 12620/2002.
- قيم الوزن النوعي والحجمي للعيينة المختبرة تقع في حدود القيم المتعارف عليها للركام الصغير المستخدم في الخرسانة عادية الوزن.
- النسبة المئوية للطين والمواد الناعمة تفي بحدود الكود.
- يتضح مما سبق أن نتائج العينات المختبرة للرمل تفي بمتطلبات الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.



١٢ إبراء السـ

٢. د. إبراهيم

٣.٣ الأسمنت: اختبارات الصلاحية (الخواص الطبيعية والميكانيكية)

أُجريت الاختبارات الآتية على الأسمنت طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الجزء ١ لسنة ٢٠٢٠ والجزء ٧ لسنة ٢٠٢٠ ومقارنة النتائج بحدود المواصفات القياسية المصرية ٤٧٥٦ الجزء الأول لسنة ٢٠٢٢:
- ثبات الحجم (لوشاتلييه).

- زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي.

- مقاومة الضغط.

o مقاومة الضغط عند عمر ٢ يوم تفي بحدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت CEM I 42.5 N.

يتضح مما سبق أن نتائج عينة الأسمنت المختبرة تفي بمتطلبات الخواص الطبيعية والميكانيكية للمواصفات القياسية المصرية وسيتم موافاة المحطة بنتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوماً.

٣.٤ الماء: اختبارات الصلاحية (الخواص الكيميائية)

أُجريت الاختبارات الآتية على مياه الخلط طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٨٦٣/٢٠٢٣، ١٨٤٦/٢٠٠٦، ١٨٤٦/٢٠٠٦ ودليل الاختبارات المعملية لمواد الخرسانة (الملحق الثالث) - إصدار ٢٠٢٣، ومقارنة النتائج بحدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.
- تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات

- الأملاح الكلية الذائبة TDS

- الأس الهيدروجيني pH

تشير نتائج الاختبارات بالمرفق رقم (١) إلى أن الماء المختبر للاستخدام في الخلطات الخرسانية يفي بحدود القبول بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.

٣.٤ نتائج معايرة موازين محطة الخلط

أُجريت المعايرة باستخدام الأوزان المتواجدة بالمحطة أثناء الزيارة وذلك للتحقق من دقة وصحة تدريجات الموازين المستخدمة بالمحطة لوزن مكونات الخلطات الخرسانية (الأسمنت، الركام، المياه، الثلج، الإضافات).
ويبين المرفق رقم (٢) نتائج المعايرة حيث يتضح من النتائج أن نسب التفاوت في قياس الموازين تقع في حدود القيم المسموح بها طبقاً للمواصفات الأمريكية ASTM C94.



إبراهيم

د. إبراهيم

تلفون: ۲۲۲۵۱۷۲۲ - (۰۲) ۲۲۲۵۱۸۵۲ / فاكس: ۲۲۲۵۱۵۶۵

٢.٥ نتائج اختبارات التجانس

يبين الجدول رقم (٢) نتائج اختبارات التجانس، ويتضح منها أن الخرسانة المنتجة تفي بمتطلبات التجانس من حيث قيم الهبوط ووزن المتر المكعب ومحتوى الهواء المحبوس للخرسانة الطازجة ومحتوى الركام الكبير والفرق بين نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام طبقاً لمتطلبات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94.

جدول رقم (٢): نتائج اختبارات التجانس على الخلطة ذات مقاومة الضغط المميزة ٥٠٠ كجم/سم^٢

الاختبار	نتائج الاختبار	متوسط نتائج الاختبار	الفرق بين نتائج اختبار العينات	الحد الأقصى المسموح به للفرق بين نتائج اختبار عينات مأخوذة من موقعين في دفعة الخرسانة*
الهبوط (مم)	٢١٠	٢٠٠	٢٠	٣٨ مم
	١٩٠			
مقاومة الضغط عند عمر ٧ أيام (كجم/سم ^٢)	٤٩٧	٤٩٦,٥	٠,٢٠	٧,٥٠ %
	٤٩٦			
وزن المتر المكعب (كجم/م ^٣)	٢٤٣٣,٩	٢٤٣٤,٥	١,٢٠	١٦ كجم/م ^٣
	٢٤٣٥,١			
محتوى الهواء المحبوس بالحجم من الخرسانة (%)	١,٨	٢,١٥	٠,٧	١ %
	٢,٥			
محتوى الركام الكبير: نسبة الوزن المحجوز على المنخل ٤,٧٥ مم (%)	٤٨,١٨	٤٧,٠٠	٢,٣٦	٦ %
	٤٥,٨٢			

* حدود المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة عادية الوزن والاشتراطات الفنية والبيئية لمحطات الخلط لسنة ٢٠٠٧ والمواصفة القياسية الأمريكية ASTM C94.



إبراهيم
إبراهيم

٣.٥ نتائج مقاومة ضغط عينات الخرسانة عند عمر ٢٨ يوم

يوضح الجدول رقم (٣) نتائج اختبار مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للعينتين المسحوبتين من الخرسانة المنتجة من المحطة ذات مقاومة ضغط مميزة ٥٠٠ كجم/سم^٢.

جدول رقم (٣): نتائج مقاومة الضغط عند عمر ٢٨ يوم للخلطة ذات مقاومة الضغط المميزة ٥٠,٠ كجم/سم^٢

رقم	مقاسات (سم)			وزن العينة	الوزن الحجمي	حمل الكسر	مقاومة الضغط	التاريخ	
	طول	عرض	ارتفاع	كجم	جم/سم ³	طن	كجم/سم ²	الصب	الكسر
عينة رقم (١)	١٥,١٠	١٥,١٠	١٤,٩٠	٨,٢٧	٢,٤٤	١٣٩,٤	٦١١	٢٠٢٦ / ٥ / ٣	٢٠٢٦ / ٦ / ١
	١٥,٢٠	١٥,٠٠	١٥,٠٠	٨,٢٥	٢,٤١	١٣٢,٢	٥٨٠	"	"
	١٥,١٠	١٥,٣٠	١٥,٣٠	٨,٢٩	٢,٣٤	١٣٠,٢	٥٦٤	"	"
	١٥,٠٠	١٥,٢٠	١٥,٠٠	٨,١٧	٢,٣٩	١٢٤	٥٤٤	"	"
	١٥,١٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٨,١٢	٢,٤٠	١٢٨,٣	٥٦٦	"	"
	١٥,٠٠	١٤,٩٠	١٥,٠٠	٨,٠٨	٢,٤١	١٣٥,٢	٦٠٥	"	"
عينة رقم (٢)	١٥,١٠	١٥,١٠	١٥,٠٠	٨,٢٤	٢,٤١	١٥٣,٢	٦٧٢	"	"
	١٥,١٠	١٥,١٠	١٤,٩٠	٨,٢٠	٢,٤١	١٥٢,١	٦٦٧	"	"
	١٥,١٠	١٥,١٠	١٥,٠٠	٨,٣٣	٢,٤٤	١٣٨,٢	٦٠٦	"	"
	١٥,١٠	١٥,١٠	١٥,١٠	٨,٢٦	٢,٤٠	١٤٨,٨	٦٥٣	"	"
	١٥,١٠	١٥,٢٠	١٥,١٠	٨,٢٣	٢,٣٧	١٣٠,٣	٥٦٨	"	"
	١٥,١٠	١٤,٩٠	١٥,١٠	٨,٣٢	٢,٤٥	١٣١,٧	٥٨٥	"	"

يتضح من الجدول عاليه ان:

- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (١) عند عمر ٢٨ يوم هي ٥٧٨ كجم/سم^٢
- متوسط مقاومة الضغط للعينة رقم (٢) عند عمر ٢٨ يوم هي ٦٢٥ كجم/سم^٢
- متوسط المقاومة عند عمر ٢٨ يوم ٦٠١ كجم/سم^٢ والتي تحقق مقاومة الضغط المميزة المطلوبة ٥٠٠ كجم/سم^٢ عند عمر ٢٨ يوم.

٦. نتائج معايرة ماكينة الضغط

يحتوى المعمل الملحق بالمحطة على ماكينة ضغط ELE وسعة ١٨٠٠ كيلونيوتن وقد أجريت المعايرة لها خلال الزيارات التي تمت للمحطة طبقاً للمواصفة الدولية ISO 7500-1 وقد اتضح أن الماكينة تحقق اشتراطات المواصفات القياسية المصرية الخاصة باختبار الضغط للمكعبات الخرسانية.

۲. د ابرار، افاضی ۵۵

١٣- اعتماد المركز للمحطة المذكورة لا يعد ضمانا لمنتج المحطة على مدار فترة الاعتماد ولكن شهادة بقدرة المحطة بما فيها من موازين وخلطة ومعمل وتشوينات مطابقة للمواصفات على إنتاج خرسانة مطابقة للمواصفات ما لم تقم المحطة بتغيير مصدر التشوينات دون إخطار المركز.

١٤- تسري فقط نتائج اختبارات العينات المختبرة والتي تم سحبها من المحطة على التشوينات الموجودة بالمحطة وقت المعاينة ولا تسري على أية تشوينات أخرى.

١٥- على الجهات القائمة بأعمال ضبط الجودة والإشراف بالمشروعات التي تورد لها المحطة الخرسانة التحقق من جودة وصلاحية المواد المستخدمة في الخلطة الخرسانية ودورية الاختبارات طبقا لجدول ٨-٢ بالكود المصري رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥ ونسب مكونات الخرسانة ومطابقتها لتصميم الخلطات الخرسانية المعتمدة ذات الرتب المختلفة وتوفير متطلبات ضبط الجودة بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥.

• ويوضح مرفق رقم (٤): قائمة تقييم واعتماد محطة الخلط.

• وقد حققت المحطة اشتراطات المواصفة الفنية للخرسانة الجاهزة بدرجة (94%) Class A

والله ولي التوفيق ،،،

وكيل المعهد



أعضاء لجنة التقييم والاعتماد:


أ.د/ إسراء إمام أ.د.إبراهيم

م/ إسراء السيد






صورة رقم (١): منظر عام لمحطة الخط

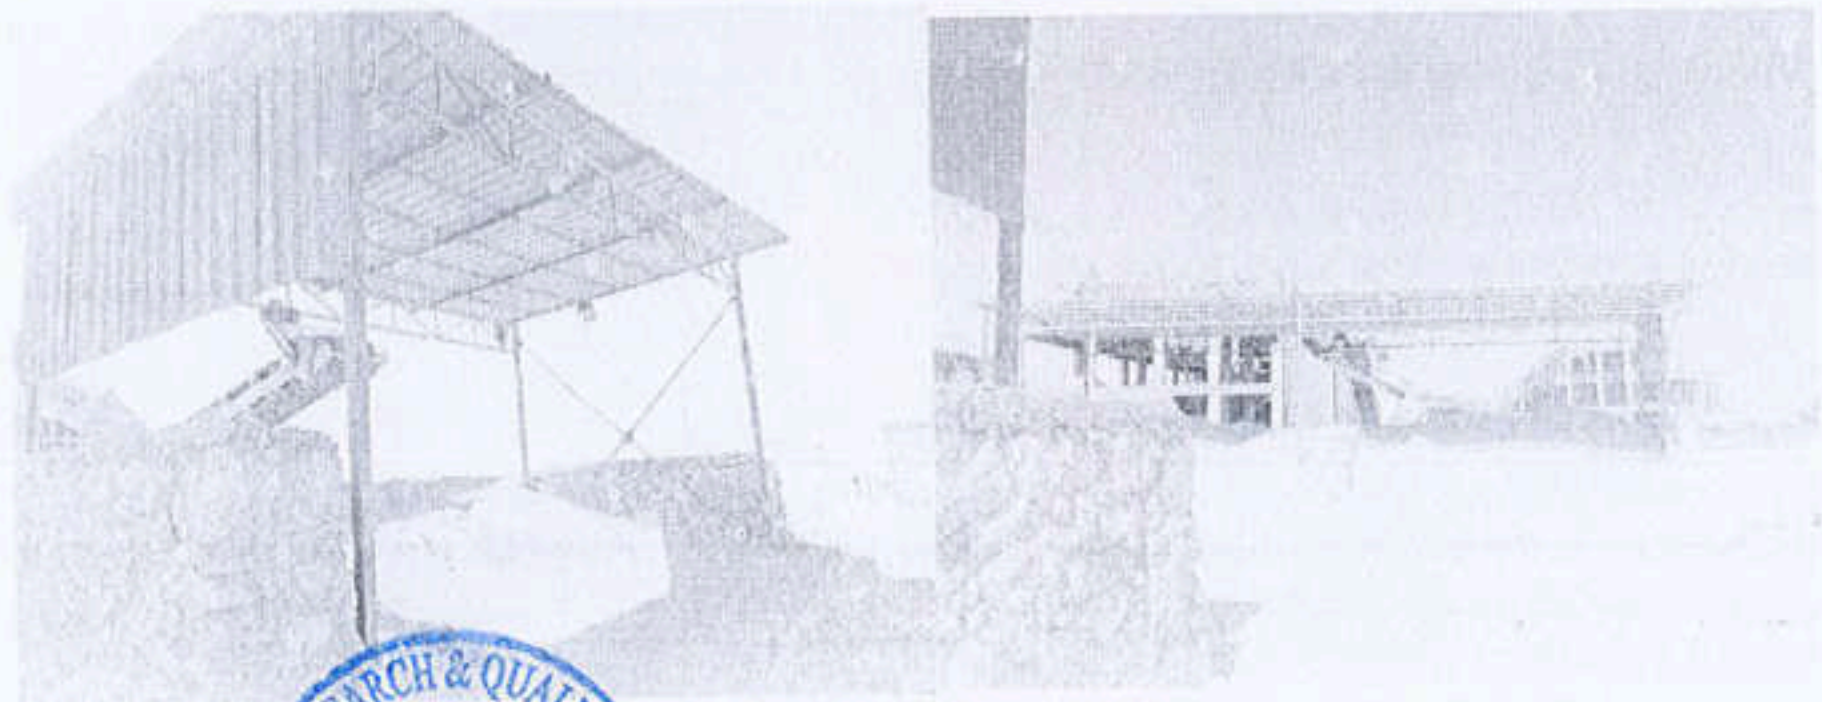


صورة رقم (٢) : تشوينات الركاب

۱۳۱۴/۱/۱۴۱۵
مدرسہ اسلامیہ

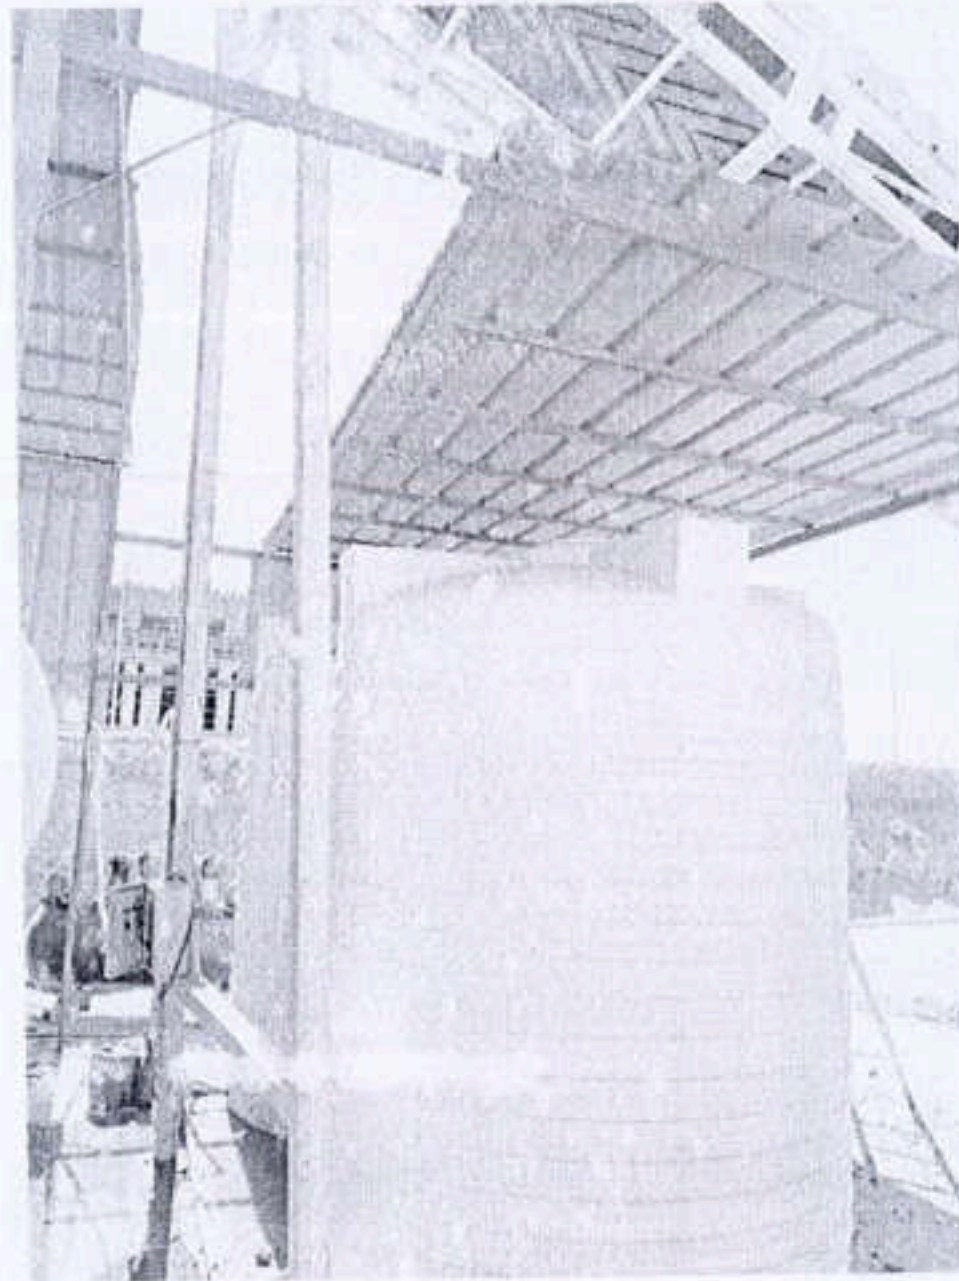


صورة رقم (٣): حاويات الإضافات

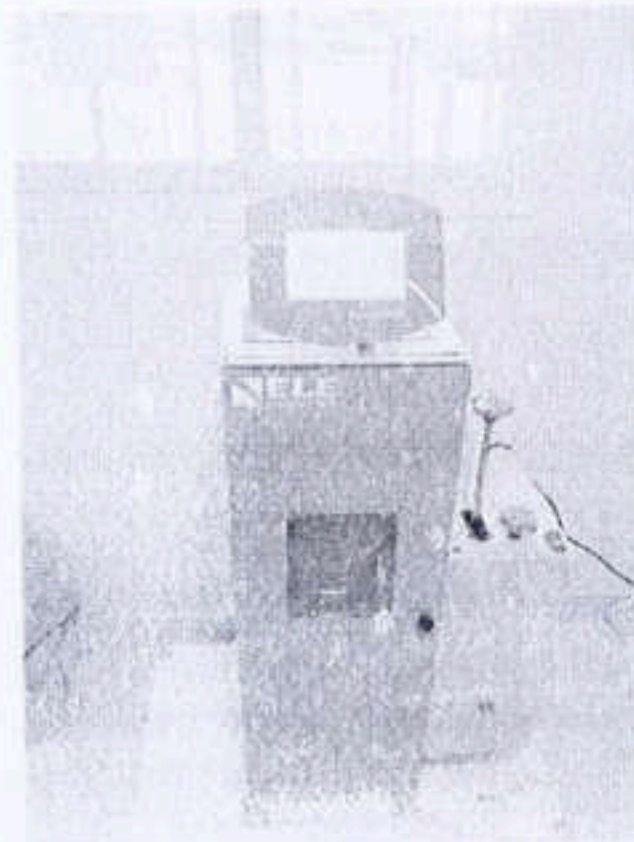

صورة رقم (٤): ماكينة تكسير مكعبات الخرسانة بالمعمل



أ.م.د. إبراهيم السيد
إبراهيم السيد

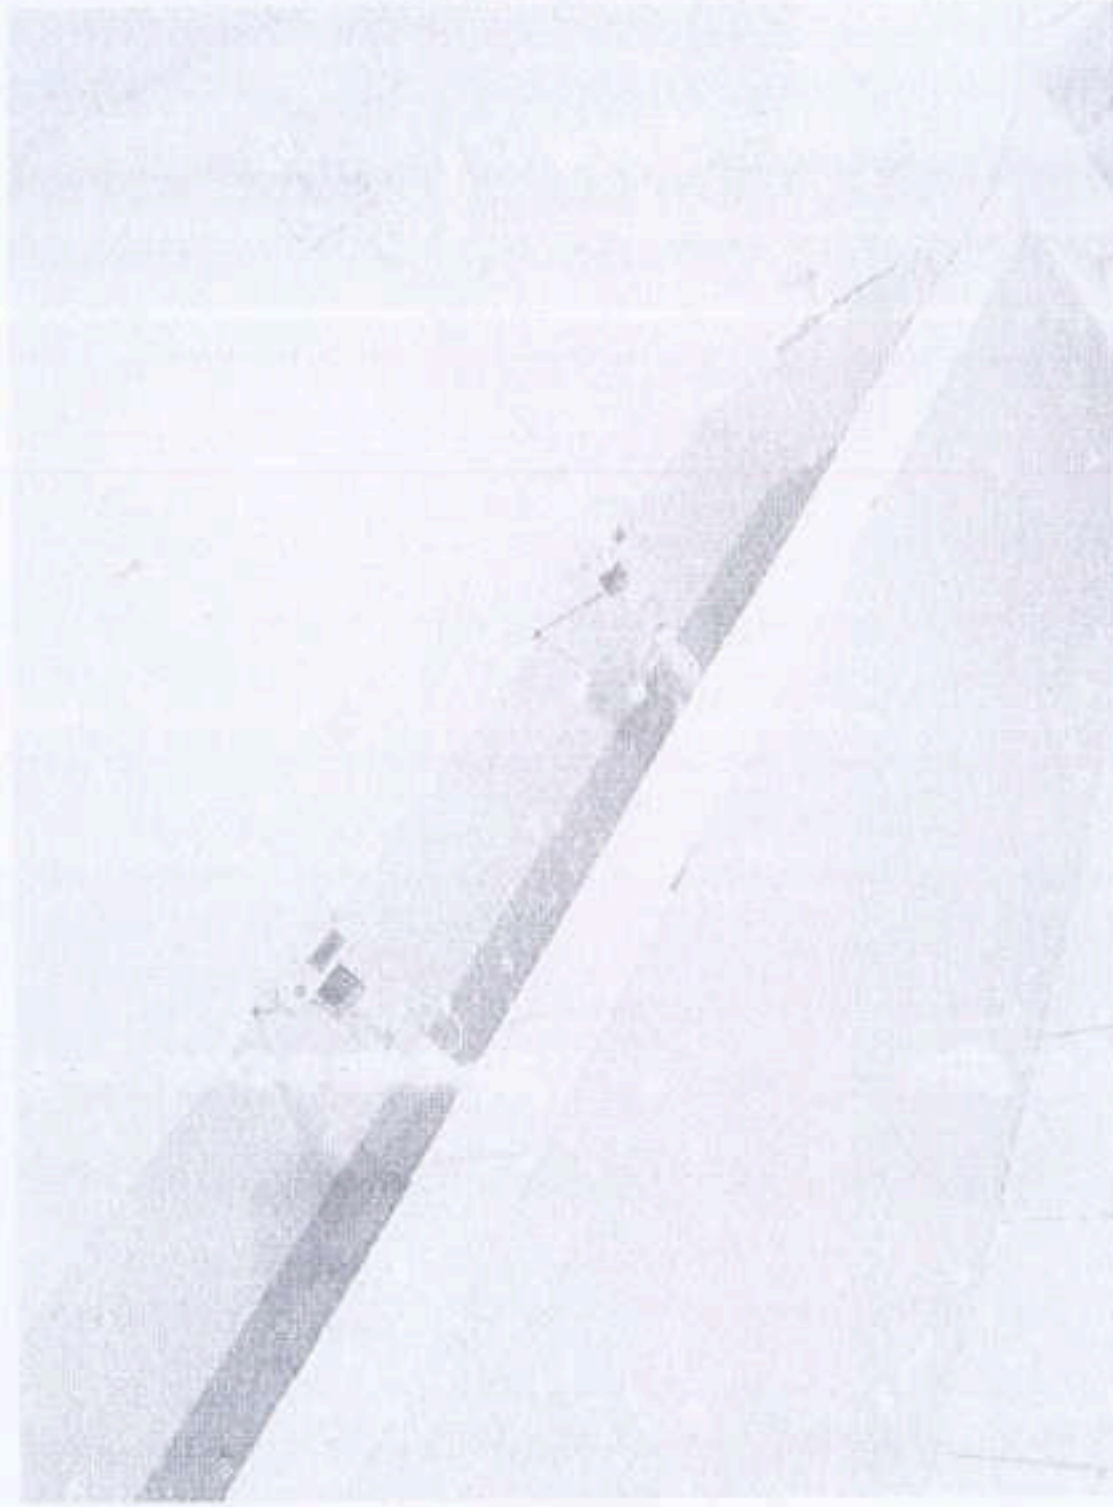

صورة رقم (٥): أحواض المعالجة بالمعمل

١٢٠٠٠

٣٠٠٠٠




مرفق رقم (١)
نتائج اختبارات المواد

تقرير اختبار

رقم التقرير: (190) (2026 / LAB-3 / 01)

اسم العميل: معهد بحوث المواد	اسم المحطة: كونكريت للتجارة و المقاولات
وصف العينة ومصدر الركام: سين مخلط بمعرفة العميل	موقع المحطة: مشروع ذا ميديان - زهراء مدينة نصر
اسم الكسارة: كسارة المصطفى - عتاقة - السويس	كود العينة: Rag /2387
تاريخ إستلام العينة: 2026/5/6	تاريخ الاختبار: 2026/5/19
كود الاختبار: RAW/LAB-3/Test 01-Alkali	
طريقة الاختبار المستخدمة: تعيين النشاط القلوي لمونة الاسمنت والركام (طريقة منشور المونة)*	
الظروف البيئية: (1) درجة حرارة الخلط: 22 ± 1 °م - الرطوبة النسبية: 54 ± 1 % (2) درجة حرارة الغمر: 80 ± 2 °م	

نتائج الاختبار

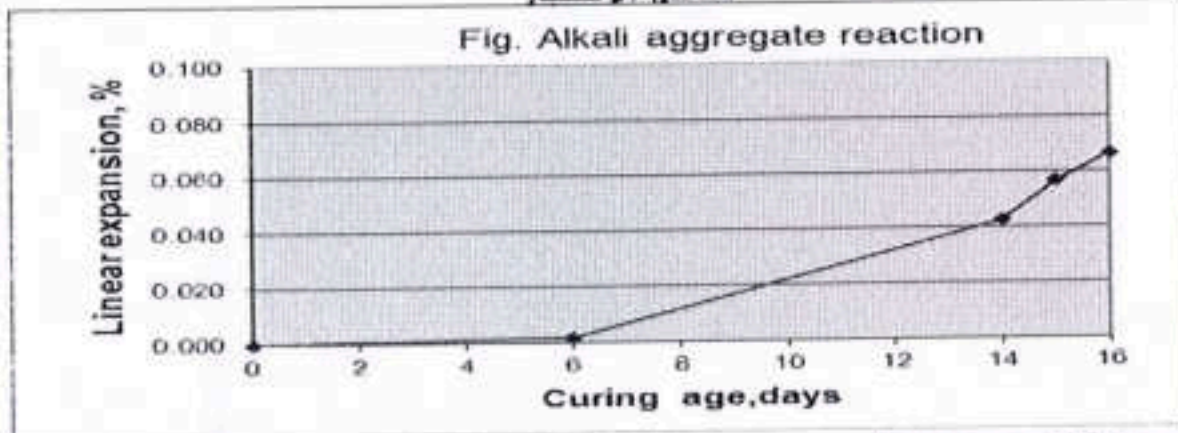

curing time (days) from casting	Average linear Expansion of three samples, (%)	Notes
0	0.000	
6	0.002	
14	0.043	
15	0.056	
16	0.067	

(%)	الاختبار
0.067	التفاعل القلوي مع الركام بعد 16 يوم من يوم الصب

ملاحظات عامة
نوع الأسمنت المستخدم: بورتلاندى CEMI 42.5 N
اسم الشركة المنتجة: شركة بنى سويف للأسمنت
تاريخ الاختبار للأسمنت: 16/3/2026
محتوى القلويات من الأسمنت المستخدم:
Na₂O=0.35%
K₂O=0.15 %
Na₂O Eq.=0.45%
نسبة تمدد الأسمنت: 0.003%
W/C=0.47%
الفحص البصري: لا يوجد تغيرات على سطح العينة

ملحوظة: لا تسري هذه النتائج بعاليه إلا على العينات الموردة من الجهة طالبة الاختبار فقط
* الحدود طبقا للمواصفات القياسية الأمريكية ASTM C 1260-23 و حدود الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 203 لسنة 2020
1- تعتبر العينة غير ضارة عندما لا يزيد التمدد القلوي عن 0.1% عند عمر 16 يوم.
2- تعتبر العينة ضارة ومرفوضة فى حالة إذا كان التمدد أكبر من 0.2% عند عمر 16 يوم.
3 - فى حالة إذا كان التمدد يقع بين 0.1% - 0.2% يتم أخذ الإجراءات الاحترازية طبقا للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 203 لسنة 2020.
4- ربما يكون من المفضل ومن المفيد استكمال إجراء الاختبار حتى عمر 28 يوم إذا كان التمدد أكبر من أو يساوى 0.1% (0.1-0.2) عند عمر 16 يوم.
* نتيجة هذا الاختبار لا تعتبر وحدها دليل على صلاحية الركام للاستخدام فى المنشآت الخرسانية طبقا لكود رقم 203 لسنة 2020
** فيما يخص أعمال المنشآت الخرسانية وطبقا للكود المصري يوصى بإجراء اختبارات التفاعل القلوي وثبات الحجم للركام وحيود الأشعة السينية (XRD) والفحص البتروجرافى على جميع عينات الركام المستخدمة فى المنشآت الخرسانية.

مدير المعمل

مشرف ومراجع

القائم بالاختبار

التوقيع: *حسام السهان*
التوقيع: *حسام السهان*
التوقيع: *حسام السهان*



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and Processing Research
Institute



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National Research Center

ملاحظات:

- تم تسليم العينة إلى المعمل بمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون أدنى مسئولية على المركز.
- النتائج المرفقة تسري فقط على العينة المقدمة للمركز مع الأخذ في الاعتبار أن النتائج لا تسري ولا يعتد بها لاعتماد أي إنتاج كمي / والممارسات/ والتوريدات / وكذلك التصدير ولا يعتد بها كشهادة مطابقة.
- يجب الرجوع للكود المصري في حالة وجود آلية لتحديد دورية إجراء الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير هي 3 شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز.
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة 2017 من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء.

مدير المعمل

مشرف ومراجع

القائم بالاختبار

التوقيع: 

التوقيع: 

التوقيع: 





المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National Research Center

رقم التقرير (414/Lab:2 /2026)

العميل :	معهد بحوث مواد البناء وضبط الجودة
الموقع :	محطة كونكريت للتجارة والمقاولات-مشروع ذا ميديان زهرهء مدينة نصر
اسم المشروع :	تاريخ السحب : ٢٠٢٦/٥/٣
نوع/ وصف العينة :	عينة رمل ، سن
تاريخ إستلام العينة :	٢٠٢٦/٥/٦
نوع الاختبار :	تحديد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات
بيانات أخرى :	* حدود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠
	كود العينة : Rsa 2386-Rag 2387
	تاريخ الاختبار : ٢٠٢٦/٥/١٣
	طريقة الاختبار : BS EN, 1744-1:2009 +A1:2012

الاختبار	الرمل	السن	حدود الكود المصري *
الكلوريدات Cl^- %	٠,٠١٣	٠,٠٢٥	لا تزيد عن ٠,٠٠٦ % للركام الصغير ولا تزيد عن ٠,٠٠٤ % للركام الكبير
الكبريتات SO_3 %	٠,٠٢٥	٠,٠٢٣	لا تزيد عن ٠,٠٤ % للركام الصغير والكبير

- تم تسليم العينة الى المعمل لمعرفة الجهة طالبة الاختبار.
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب الجهة طالبة الاختبار دون ادنى مسئولية على المركز .
- النتائج الموضحة عاليه تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز من الجهة طالبة الاختبار .
- يجب الرجوع الى الكود المصري في حالة وجود آلية لتحديد دورية الاختبار.
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير الا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببند المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء.

القائم بالاختبار

6/25.5.F

۱.د/ احمد سيد كامل عوده



INTERNATIONAL
ACCREDITATION
SERVICE

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
معامل معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء

إختبارات مياه

كود النموذج HBRC-RAW-F-7.8-01

رقم التقرير (414 / Lab:2 / 2026)

العميل :	معهد بحوث مواد البناء و ضبط الجودة
الموقع اسم المشروع :	محطة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع ذا ميدان زهرهء مدينة نصر تاريخ السحب : ٢٠٢٦/٥/٣
نوع/وصف العينة :	عينة مياه
تاريخ إستلام العينة :	٢٠٢٦/٥/٦
نوع الاختبار :	تحدد محتوى أملاح الكلوريدات والكبريتات والأملاح الكلية الذائبة والأس الهيدروجيني
طريقة الاختبار :	المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٠٠٦/١٨٤٦، ٢٠٠٦/١٨٤٧، ٢٠٢٣/١٨٦٣ ودليل إختبارات الخرسانة ٢٠٢٣
بيانات أخرى :	* حدود الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية المسلحة رقم ٢٠٣ إصدار ٢٠٢٠

النتائج

الاختبار	العينة	حدود الكود المصرى *
الكلوريدات Cl^- (ppm)	١٨٤	لا تزيد عن ٥٠٠ (جزء فى المليون)
الكبريتات SO_3 (ppm)	١٥٠	لا تزيد عن ٣٠٠ (جزء فى المليون)
الأملاح الكلية الذائبة TDS (ppm)	٦٦٨	لا تزيد عن ٢٠٠٠ (جزء فى المليون)
الأس الهيدروجينى pH	٧,٦٢	لا تقل عن ٧,٠٠

ملاحظات :

- تم تسليم العينة الى المعمل بمعرفة معهد بحوث مواد البناء.
- البيانات المذكورة عاليه طبقا لما تم ذكره بخطاب معهد بحوث مواد .
- النتائج الموضحة عاليه تسرى فقط على العينة المقدمة للمركز .
- مدة سريان هذا التقرير ٣ شهور ولا يسمح بنسخ هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز .
- يلتزم المعمل ببنود المواصفة الدولية ISO 17025 لسنة ٢٠١٧ من حيث سرية البيانات والشفافية وكذا الحيادية مع العملاء

مدير المعمل
أ.د/ أحمد سيد كامل عوده
٢٠٢٦/٥/١٩

مشرف المعمل
٢٠٢٦/٥/١٩

القائم بالاختبار



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute



ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

كود النموذج RAW – FRM-21-12

113/T

تقرير الفحص البتروجرافى والمعدنى لعينات الركام الكبير
Petrographic and Mineralogical Investigation Report

Sample Code Rag 2387
Sample Type: Aggregate
Date: 7/5/2026

الجهة الموردة / العميل	كونكريت للتجارة والمقاولات
الموقع / اسم المشروع	موقع المحطة: مشروع ذا ميدان زهرة مدينة نصر مصدر المن: كمارة المصطفى - عقافة السويس
بيانات أخرى	-----

Hand Specimen Description:

Source	Natural	Hardness	Hard	Color	Grey
Mineral Grain Size	Fine-grained	Surface Texture	Rough	Shape	Irregular
Weathering Degree	Fresh	Other Features	-----		

Petrographic Description:

The thin-section photomicrograph shows that the studied sample contains essentially fine to medium, isolated and euhedral to anhedral dolomite crystals. Dolomite crystals characterized by cloudy core (inclusion-rich and inclusion-free). Also, fine to coarse calcite crystals (micrite to microsparite) were noticed filling interspaces among dolomite crystals. Moreover, sharp and uniform peloids crystals were observed while examination resulted from pelletizing action of organisms. The main texture of the studied sample can be called floating rhomb mosaic texture.

Conclusion:

- The investigated sample is *Calcitic Dolomite* aggregates.
- It is necessary to carry out XRD investigation and alkali reaction.

*The test is carried out using Egyptian code NO.203,2023.

Remarks

The sample was delivered to the laboratory by the entity requesting the test.

The aforementioned data according to what was mentioned in the letter of the body requesting the test without any responsibility on the centre.

- The attached results apply only to the sample submitted to the center, bearing in mind that the results are not valid and are not valid for the approval of any quantitative production / and practices / supplies / as well as export and is not considered as a conformity certificate.
- The Egyptian code must be referred to if there is a mechanism to determine the periodicity of conducting the test.
- The report is valid for 3 months. It is not allowed to reproduce this report except with the written consent of the centre.
- The laboratory is bound by terms of the international standard for accreditation of laboratories ISO 17025 of 2017 in terms of confidentiality of data, transparency and neutrality with customers.

فيما يخص أعمال المنشآت الخرسانية وطبقاً للكود المصرى رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٣ م يوصى بإجراء اختبارات التفاعل القلوى للركام وكذلك اختبارات ثبات الحجم وحيود الأشعة السينية (XRD) والفحص البتروجرافى على جميع عينات الركام التى ستستخدم فى المنشآت الخرسانية.

القائم بالإختبار: د. أحمد محمد مصطفى
مدير المعمل: د. أحمد محمد مصطفى
مدير المعمل: د. أحمد محمد مصطفى
مدير المعمل: د. أحمد محمد مصطفى

عدد الصفحات (١/٢)

87 El-Tahrir St., Dokki, Giza 11511.P.O.Box: 1770 Cairo, EGYPT.

Phone: (+202) 7617102, 7617092 Fax: 3351564, 7628736

www.hbrc.edu.eg

٨٧ شارع التحرير الدقى - جيزة ص. ب. ١٧٧٠ القاهرة

E-mail: hbrc.@hbrc.edu.eg



معهد بحوث الخامات وتكنولوجيا صناعة مواد البناء
Raw Building Materials Technology and
Processing Research Institute




ACCREDITED
Testing Laboratory



المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
Housing and Building National
Research Center

Petrographical and Mineralogical Test Report
Pattern Code: RAW - FRM - 21- 10

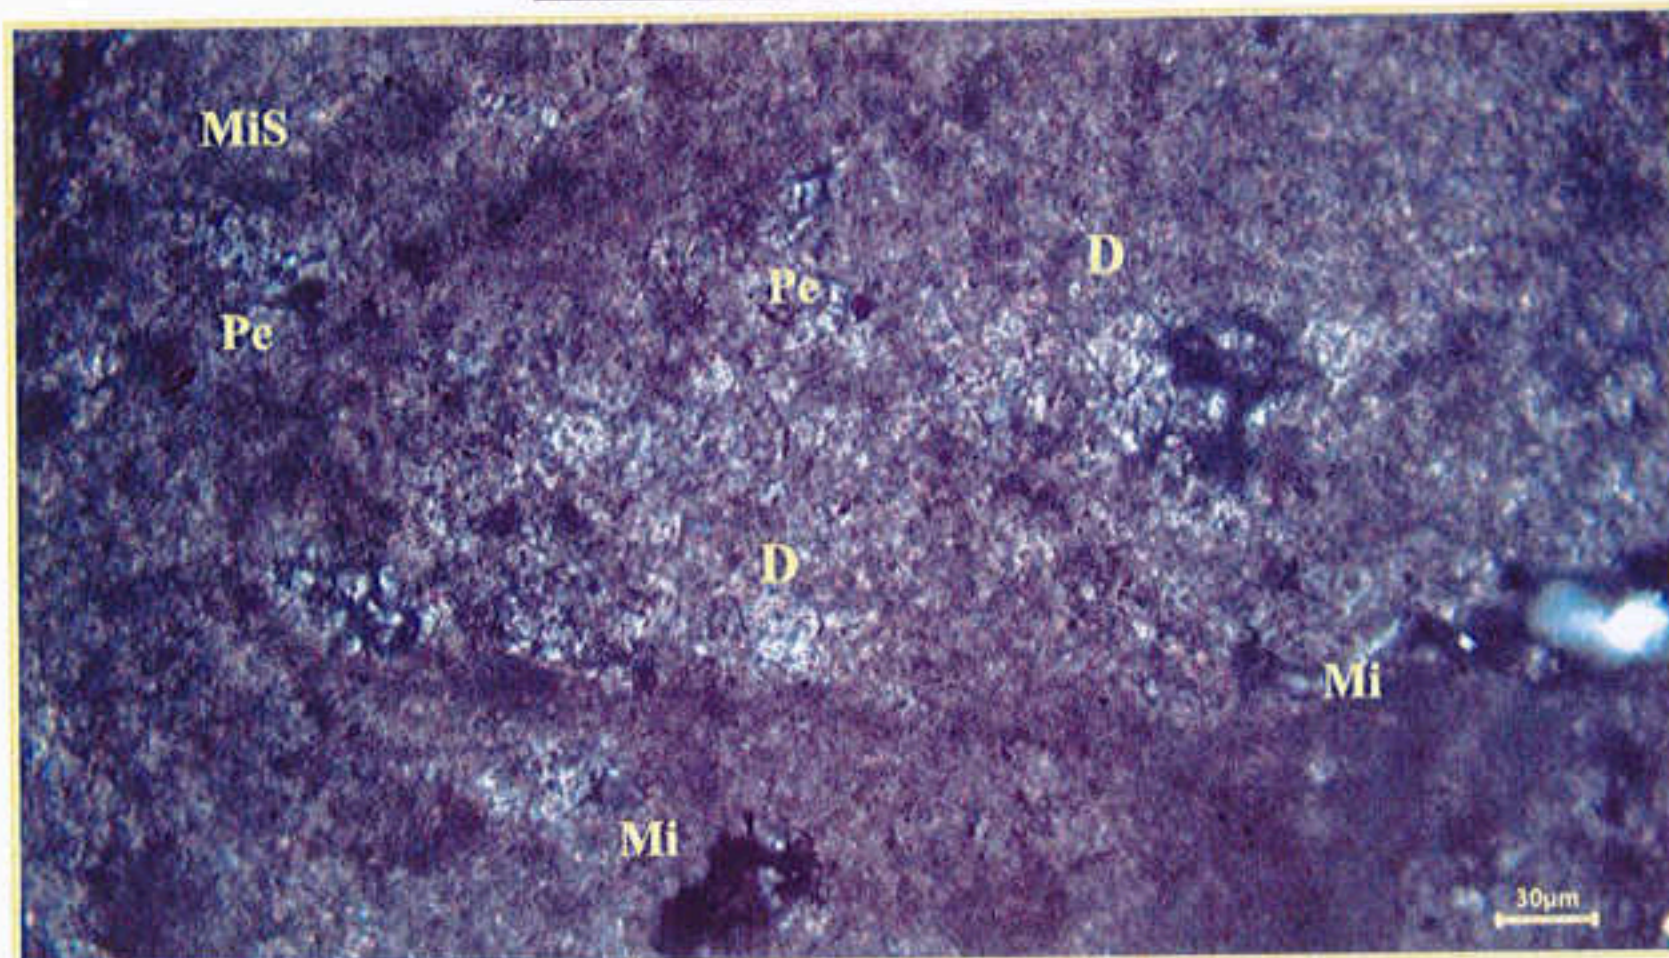

Thin section photomicrograph of the sample submitted by
Rag 2387 - كوناكريت للتجارة والمقاولات (XPL: 10 X)
D: Dolomite **Pe:** Peloids **Mi:** Micrite **Mis:** Microsparit

Test Staff Member
Geologist: Omar Atef Mohamed



عدد الصفحات (٢/٢)

نتائج الاختبارات الطبيعية والميكانيكية للأسمنت

كود العينة : MTL/CE/S/ 10/05/2026
تاريخ السحب : ٢٠٢٦/٠٥/٠٣

الجهة الموردة: محطة شركة كونكريت للتجارة والمقاولات
المشروع (وسيلة الاتصال بالعميل): اعتماد محطة خرسانة جاهزة - ذا ميدان زهراء مدينة نصر

نوع / رتبة الأسمنت : CEM I 42.5 N

بيانات إضافية :

النتائج :

الخاصية	الاختبار	النتائج	الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
الخواص الطبيعية	التمدد بطريقة لوشاتيلية*	مم	لا يزيد عن ١٠	٢٠٢٦/٠٥/١٢	٢٠٢٦/٠٥/١٣
	زمن الشك الابتدائي*	دقيقة	لا يقل عن ٦٠	٢٠٢٦/٠٥/١٢	٢٠٢٦/٠٥/١٣
	زمن الشك النهائي*	دقيقة	٢٠٥		

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الانحناء **	١	٤,٢	٤,٠		٢٠٢٦/٠٥/١١	٢٠٢٦/٠٥/١٣
	عند عمر ٢ يوم	٢	٤,٠				
	ميجاباسكال	٣	٣,٨				

الخاصية	الاختبار	رقم العينة	النتائج		الحدود	تاريخ تجهيز العينات	تاريخ إجراء الاختبار
			المفردة	المتوسط			
الخواص الميكانيكية	مقاومة الضغط **	١	١٨,٧	١٧,٩	لا يقل عن ١٠	٢٠٢٦/٠٥/١١	٢٠٢٦/٠٥/١٣
		٢	١٨,٢				
		٣	١٧,٧				
		٤	١٧,٤				
		٥	١٨,٠				
		٦	١٧,٤				

* حدود المواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .
في الاسمنت بحدود الخواص الطبيعية والميكانيكية عند عمر ٢ يوم للمواصفات القياسية المصرية للأسمنت م.ق.م. ١-٤٧٥٦ لسنة ٢٠٢٢ .
تم اتخاذ القرار طبقاً لـ ILAC - G8:09 بند ٤.٢.١

ملاحظات :

- تم إجراء الاختبارات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية م.ق.م. ٢٤٢١ الجزء (٧.١) لسنة ٢٠٢٠.
- تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز.
- تسري النتائج عالية على نوع العينات المختبرة.
- لا يسمح بإعادة إصدار هذا التقرير إلا بموافقة كتابية من المركز.

رئيس المجموعة الفنية

أ.د. ايناس أحمد خطاب



المشرف

د. أحمد خطاب
٢٠٢٦/٠٥/١٤

إعداد التقرير


أ.د. سام
١٤/٥/٢٠٢٦

نتائج اختبار التدرج الحبيبي للركام الكبير

نوع الركام:
كبر احجار - سن ٢
تاريخ سحب العينات :
٢٠٢٦/٠٥/٠٢
كود العينة:
MTL/ AG/ 2026/ 345

اسم المحطة:
شركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع ناميديان زهراء مدينة نصر
المشروع:
اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

بيانات إضافية :

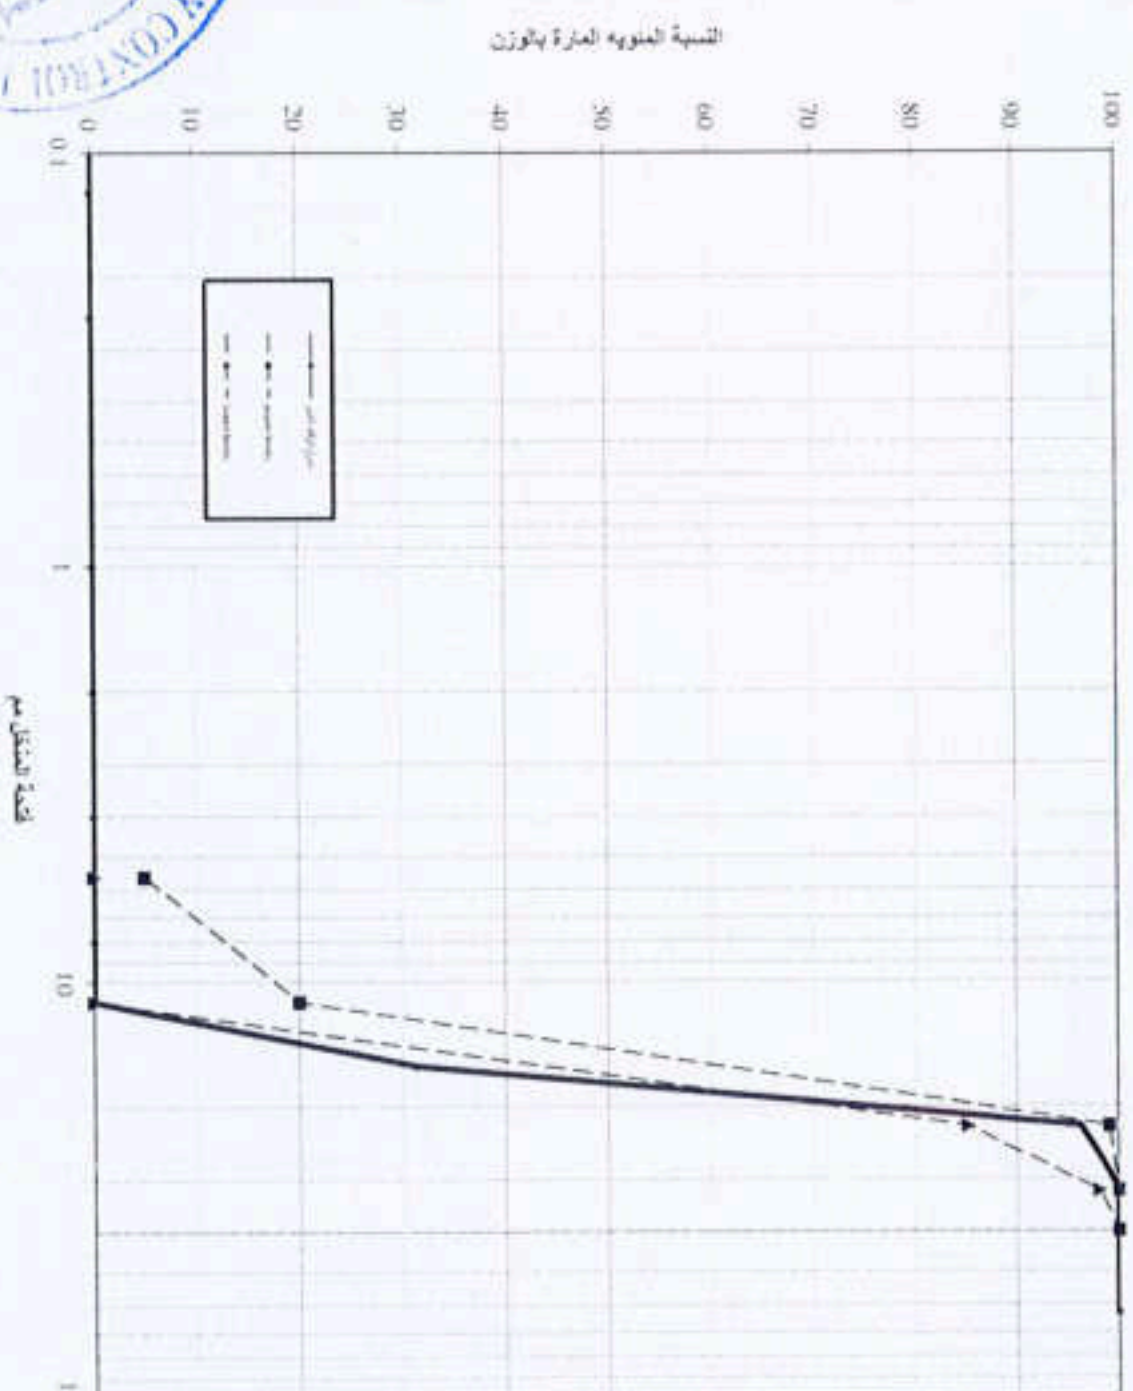

النسبة المئوية المئوية العارة للركام الكبير	مطابق	قطعة المنخل
100.00	٦٣	
100.00	٤٥	
100.00	٣٧	
٩٦.٢١	٧٢.٤	
٣١.٢٧	١٦	
٠.٠٠	١١.٢	
٠.٠٠	٨	
٠.٠٠	٥.٦	
٠.٠٠	٤	
٠.٠٠	٢	
٠.٠٠	١	
٠.٠٠	٠.٢٥	
٠.٠٠	٠.١٢٥	
٠.٠٠	٠.٠٦٣	

ملاحظات عامة :

الحدود الموضحة هي حدود الرتبة الاسمية GC 85/20 للتدرج طبقا للمواصفات الأوروبية EN 12620:2002
تم اجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأوروبية EN 0.33-1
تم سحب العينات بمعرفة مهندس المركز.



المشرف العام
د. د. إبراهيم إسماعيل

إعداد التقرير
إبراهيم إسماعيل

نتائج اختبار التدرج الحبيبي للركام الكبير

نوع الركام: كسر احجار - سن ١
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٦/٠٥/٠٣
كود العينة: MTL/ AG/ 2026/ 344


اسم المحطة: شركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع دامينيان زهراء مدينة نصر

المشروع: اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقا للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

بيانات إضافية :

ملاحظات عامة :

الحدود الموضحة هي حدود الرتبة الأساسية EN 12620-2002 و حدود الرتبة الإضافية EN 933-1-2002 طبقا للمواصفات الأوروبية
تم إجراء الاختبار طبقا للمواصفات الأوروبية EN 933-1-2002
تم سحب العينات بمعرفة مندوب المركز .

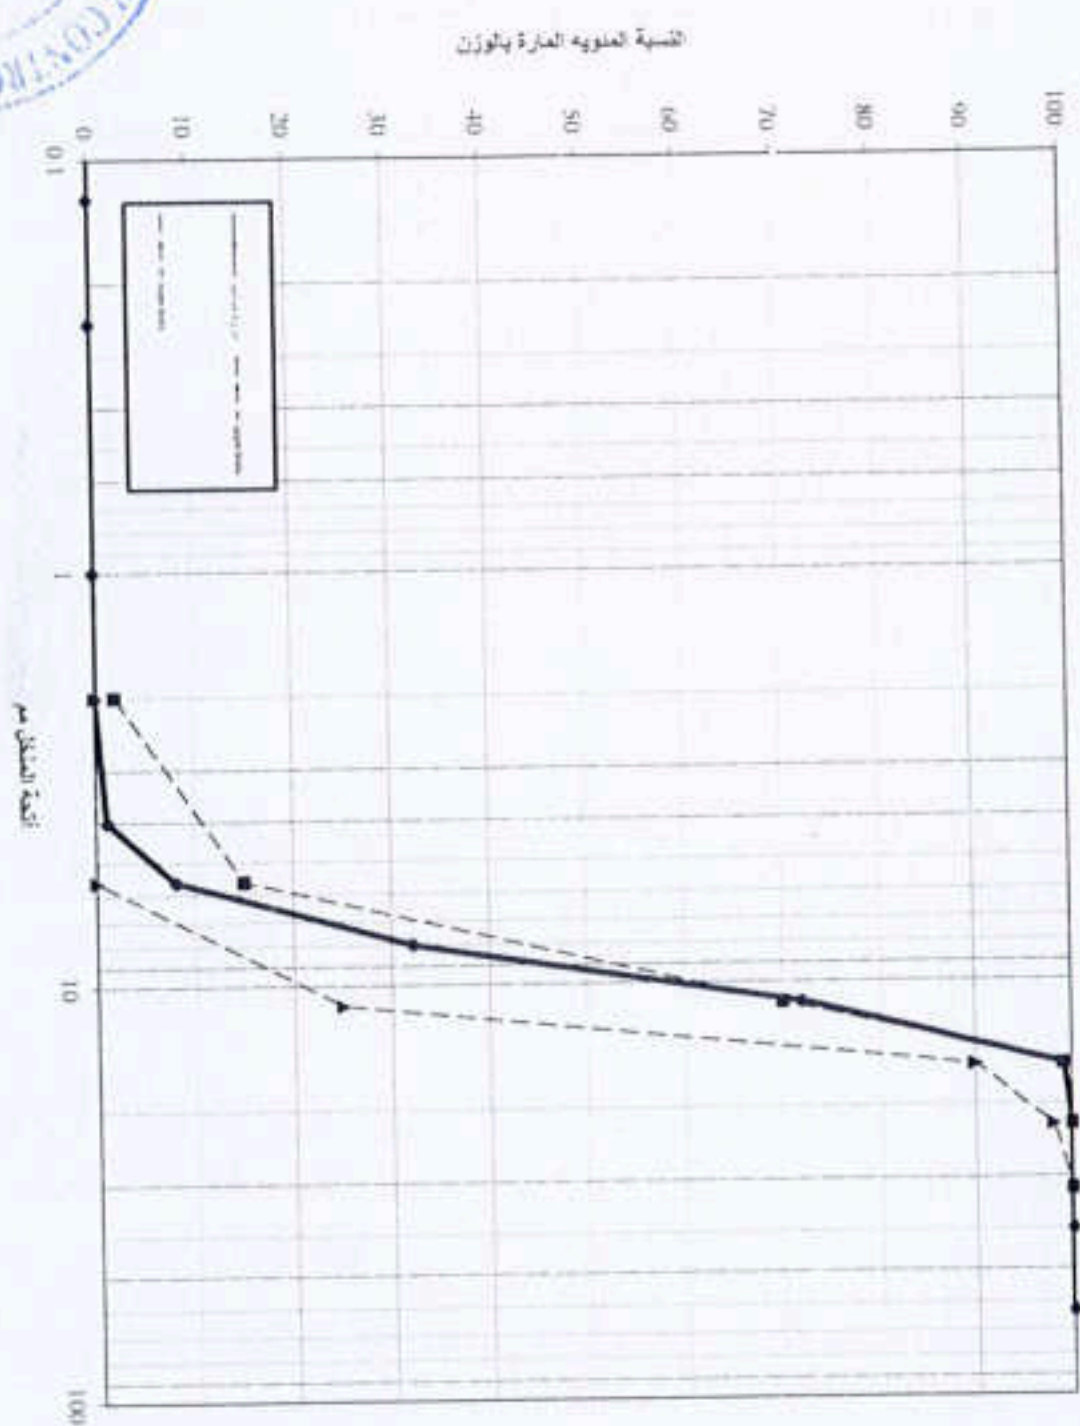

نتائج اختبارات الركام الصغير

نوع الركام: رمل

تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٦/٠٥/٣

كود العينة: MTL/AG/2026/343

اسم المحطة : شركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع داميديان زهراء مدينة نصر

المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

البيانات الإضافية : _____

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به ⁺
(١) الوزن النوعي الظاهري	٢,٦٣	----
(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣	١,٦٠	----
(٣) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة %	١,٦	%٢,٥

ملاحظات :

+ الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥

(١) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6

(٢) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3

(٣) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1

• النتائج الموضحة تسرى فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز

المشرف

إعداد التقرير

د. د. إبراهيم إمام

إبراهيم إمام



نتائج اختبارات الركام الكبير

نوع الركام: كسر احجار - سن ١
تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٦/٠٥/٣
كود العينة: MTL/AG/2026/344

اسم المحطة: شركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع داميديان زهراء مدينة نصر
المشروع: اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥
البيانات الإضافية: _____

الاختبار	النتائج	الحد الأقصى المسموح به*
(١) الوزن النوعي الظاهري	٢,٤٩	----
(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣	١,٣٩	----
(٣) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة %	٠,٣	%٢,٥
(١) النسبة المئوية للإمتصاص %	١,٤	%٢,٥
(٤) مقاومة الركام للتفتت (معامل لوس انجلس) %	٢٦	%٣٠

ملاحظات:

- + الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥
- (١) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6
- (٢) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3
- (٣) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1
- (٤) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-2
- النتائج الموضحة تسرى فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز.

المشرف

د. إبراهيم أحمد

إعداد التقرير

إ. إبراهيم أحمد



نتائج اختبارات الركام الكبير

نوع الركام: كسر احجار - سن ٢

تاريخ سحب العينات: ٢٠٢٦/٠٥/٣

كود العينة: MTL/AG/2026/345

اسم المحطة : شركة كونكريت للتجارة والمقاولات - مشروع داميديان زهراء مدينة نصر

المشروع : اعتماد محطة خلط خرسانة جاهزة طبقاً للقرار الوزاري رقم ٤٤٥ لسنة ٢٠١٥

البيانات الإضافية : _____

الحد الأقصى المسموح به*	النتائج	الاختبار
----	٢,٦٤	(١) الوزن النوعي الظاهري
----	١,٣٥	(٢) الوزن الحجمي غير المدموك طن/م ^٣
%٢,٥	٠,٢	(٣) النسبة المئوية بالوزن للمواد الناعمة
%٢,٥	٠,٧	(١) النسبة المئوية للإمتصاص

ملاحظات :

+ الحد الأقصى المسموح به بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠٢٥

(١) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-6

(٢) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 1097-3

(٣) تم إجراء الاختبار طبقاً للمواصفات الأوروبية EN 933-1

• النتائج الموضحة تسري فقط على العينات المسحوبة بمعرفة مندوب المركز

المشرف

د. د. إبراهيم إسماعيل

إعداد التقرير

إ. د. إبراهيم إسماعيل



مرفق رقم (٢)
نتائج معايرة موازين محطة الخلط

نتائج معايرة خلاطة مركزية

اسم المحطة: شركة كونكريت للتجارة والمقاولات
موقع الخلاطة: مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر
نوع الخلاطة: I-MAX إيطالي
تواريخ المعايرة: ٢٠٢٦/٤/٢٢ و ٢٠٢٦/٥/٣

١- معايرة ميزان سير الركاب:

حساسية الميزان: ١ كجم
أقصى سعة مستخدمة: ٤٦٠٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	٠	صفر	صفر	١٠	٤٠٠	٢٤٠٠	٢٤٠٣	٠,١٣
٢	٢٠٠	٢٠٠	٢٠٢	١,٠٠	١١	٤٠٠	٢٨٠٠	٢٨٠٣	٠,١١
٣	٢٠٠	٤٠٠	٤٠٣	٠,٧٥	١٢	٢٠٠	٣٠٠٠	٣٠٠٤	٠,١٣
٤	٢٠٠	٦٠٠	٦٠٦	١,٠٠	١٣	٤٠٠	٣٤٠٠	٣٤٠٢	٠,٠٦
٥	٢٠٠	٨٠٠	٨٠٥	٠,٦٣	١٤	٤٠٠	٣٨٠٠	٣٨٠٣	٠,٠٨
٦	٢٠٠	١٠٠٠	١٠٠٦	٠,٦٠	١٥	٢٠٠	٤٠٠٠	٤٠٠٤	٠,١٠
٧	٤٠٠	١٤٠٠	١٤٠٢	٠,١٤	١٦	٤٠٠	٤٤٠٠	٤٤٠٣	٠,٠٧
٨	٤٠٠	١٨٠٠	١٨٠٤	٠,٢٢	١٧	٢٠٠	٤٦٠٠	٤٦٠٣	٠,٠٧
٩	٢٠٠	٢٠٠٠	٢٠٠٤	٠,٢٠					

* لا تزيد على ١٪ طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

د. د. إبراهيم أحمد



٢- معايرة ميزان المياه:

حساسية الميزان: ١ كجم أقصى سعة مستخدمة: ٥٢٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	٤٠	٢٨٠	٢٨٢	٠,٧١
٢	٤٠	٤٠	٤٠	صفر	٩	٤٠	٣٢٠	٣٢٣	٠,٩٤
٣	٤٠	٨٠	٨٠	صفر	١٠	٤٠	٣٦٠	٣٦٣	٠,٨٣
٤	٤٠	١٢٠	١٢١	٠,٨٣	١١	٤٠	٤٠٠	٤٠٤	١,٠٠
٥	٤٠	١٦٠	١٦١	٠,٦٣	١٢	٤٠	٤٤٠	٤٤٤	٠,٩١
٦	٤٠	٢٠٠	٢٠٢	١,٠٠	١٣	٤٠	٤٨٠	٤٨٤	٠,٨٣
٧	٤٠	٢٤٠	٢٤٢	٠,٨٣	١٤	٤٠	٥٢٠	٥٢٥	٠,٩٦

* لا تزيد على ١٪ طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

٣- معايرة ميزان الإضافة:

حساسية الميزان: ٠,٠٠١ كجم أقصى سعة مستخدمة: ٢٦ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت* (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٨	٢,٠٠	١٤,٠٠	١٣,٦٣٠	٢,٦٤-
٢	٢,٠٠	٢,٠٠	١,٩٥٠	٢,٥٠-	٩	٢,٠٠	١٦,٠٠	١٥,٥٣٠	٢,٩٤-
٣	٢,٠٠	٤,٠٠	٣,٩٢٠	٢,٠٠-	١٠	٢,٠٠	١٨,٠٠	١٧,٥٨٠	٢,٣٣-
٤	٢,٠٠	٦,٠٠	٥,٨٥٠	٢,٥٠-	١١	٢,٠٠	٢٠,٠٠	١٩,٥٠٠	٢,٥٠-
٥	٢,٠٠	٨,٠٠	٧,٨٢٠	٢,٢٥-	١٢	٢,٠٠	٢٢,٠٠	٢١,٤٧٠	٢,٥١-
٦	٢,٠٠	١٠,٠٠	٩,٧٩٠	٢,١٠-	١٣	٢,٠٠	٢٤,٠٠	٢٣,٣٨٠	٢,٥٨-
٧	٢,٠٠	١٢,٠٠	١١,٧٢٠	٢,٣٣-	١٤	٢,٠٠	٢٦,٠٠	٢٥,٣٠٠	٢,٦٩-

* لا تزيد على ٣٪ طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94



١٤ / إبريل / ٢٠٢٦

د. د. إبراهيم

٤- معايرة ميزان الأسمنت:

حساسية الميزان: ١ كجم

أقصى سعة مستخدمة: ١١٠٠ كجم

م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت * (%)	م	الوزن المضاف (كجم)	الوزن الكلي (كجم)	قراءة العداد (كجم)	التفاوت * (%)
١	صفر	صفر	صفر	صفر	٧	١٠٠	٦٠٠	٦٠٣	٠,٥٠
٢	١٠٠	١٠٠	٩٩	١,٠٠-	٨	١٠٠	٧٠٠	٧٠٢	٠,٢٩
٣	١٠٠	٢٠٠	١٩٩	٠,٥٠-	٩	١٠٠	٨٠٠	٨٠٢	٠,٢٥
٤	١٠٠	٣٠٠	٢٩٨	٠,٦٧-	١٠	١٠٠	٩٠٠	٩٠٢	٠,٢٢
٥	١٠٠	٤٠٠	٣٩٨	٠,٥٠-	١١	١٠٠	١٠٠٠	١٠٠٣	٠,٣٠
٦	١٠٠	٥٠٠	٤٩٩	٠,٢٠-	١٢	١٠٠	١١٠٠	١١٠٢	٠,١٨

* لا تزيد على ١٪ طبقاً للمواصفة الأمريكية ASTM C94

- تمت المعايرة باستخدام السنج الخاصة بالمحطة.

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز.

القائم بالمعايرة

أ.د/ إسراء إمام

د. إبراهيم

م / إسراء السيد



مرفق رقم (٣)
نتائج معايرة ماكينة الضغط

نتائج معايرة ماكينة الضغط

اسم المحطة : شركة كونكريت للتجارة والمقاولات
موقع المحطة : مشروع ذا ميدان زهراء مدينة نصر
تاريخ المعايرة : ٢٠٢٦/٠٤/٢٢
بيانات الماكينة : ELE
نوع الماكينة : 36-3090-01-1221
رقم المسلسل : ----

الحساسية : ٠,٠٠١ كيلون

السعة : ٢٠٠٠ كيلونيوتن

n	Nominal Load (KN)	Actual Load (KN)			Average Actual Load (KN)	Accuracy Error	Repeatability Error
		Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3			
		F ₁	F ₂	F ₃			
0	0	0	0	0	0	0	0
1	200	201.225	201.313	201.124	201.221	-0.61%	0.09%
2	400	401.484	401.616	401.263	401.454	-0.36%	0.09%
3	600	601.029	599.110	601.717	600.619	-0.10%	0.43%
4	800	800.570	800.160	799.764	800.165	-0.02%	0.10%
5	1000	1000.423	997.917	1000.130	999.490	0.05%	0.25%
6	1200	1200.347	1198.808	1201.549	1200.235	-0.02%	0.23%
7	1400	1399.251	1401.085	1399.486	1399.941	0.00%	0.13%
8	1600	1599.251	1598.872	1598.931	1599.018	0.06%	0.02%
9	1800	1799.468	1799.029	1801.037	1799.845	0.01%	0.11%

Machine Class is 1
Max Accuracy error (%) = -0.61%
Max Repeatability error (%) = 0.43%
* According to ISO 7500-1:2004 :the maximum permissible value for accuracy error is (±1,0%) and for repeatability error is (1,0%) of class of machine range (1)

- تمت المعايرة بمعرفة ممثل المركز

- تمت المعايرة طبقاً للمواصفة ISO 7500-1

المشرف

د. د. إبراهيم إمام



إعداد التقرير

أ. د. إبراهيم إمام

مرفق رقم (٤)
قائمة تقييم واعتماد محطة الخط

قائمة تقييم واعتماد محطة الخلط

نوع الخلاطة: I-MAX - إيطالي
تاريخ المعايرة: ٢٠٢٦/٤/٢٢ و ٢٠٢٦/٥/٣

اسم المحطة: شركة كونكريت للتجارة والمقاولات
موقع الخلاطة: مشروع ذا ميديان زهراء مدينة نصر

١- مستندات ضبط الجودة المتاحة: (٥/٥)

أ. توافر مستندات اعتماد مصادر المواد (١/١)	متوفرة	☒	غير متوفرة	☐
ب. تصميم الخلطات المستخدمة من جهة متخصصة (١/١)	متوفرة	☒	غير متوفرة	☐
ج. نتائج اختبارات سابقة على المواد المستخدمة				
١. الركام (٠,٥/٠,٥)	متوفرة ومطابقة	☒	غير متوفرة أو غير مطابقة	☐
٢. مياه (٠,٥/٠,٥)	متوفرة ومطابقة	☒	غير متوفرة أو غير مطابقة	☐
د. توافر نتائج اختبارات مكعبات للخرسانة المنتجة (١/١)	متوفرة ومطابقة	☒	غير متوفرة أو غير مطابقة	☐
هـ. توافر نتائج معايير سابقة لموازين المحطة (١/١)	متوفرة ومطابقة	☒	غير متوفرة أو غير مطابقة	☐

٢- المعمل: (٧/٧)

أ. وجود معمل بالمحطة (١/١)	متوفر	☒	غير متوفر	☐
ب. وجود أحواض لمعالجة الخرسانة (١/١)	متوفرة	☒	غير متوفرة	☐
ج. التحكم في درجة حرارة أحواض المعالجة (الشتاء والصيف) (٢/٢)	متوفرة	☒	غير كافية	☐
د. تواجد ماكينة ضغط لاختبار المكعبات (١/١)	متوفرة	☒	غير متوفرة	☐
هـ. شهادة معايرة سارية لماكينة الضغط (١/١)	متوفرة ومطابقة	☒	غير متوفرة أو غير مطابقة	☐
و. وجود ترمومتر (١/١)	متوفر	☒	غير متوفر	☐

٣- التشوينات: (٣٠/٢٦)

الركام: (١٨/١٦)

☐	غير متحققة	☒	متحققة	فصل الأنواع والمقاسات (٣/٣)
☐	غير متوفرة	☒	متحققة	تغطية التشوينات (٣/٣)
☐	غير متحققة	☒	متحققة	نظافة أماكن التشوينات (٣/٣)
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	وجود مهزة للركام الكبير (٣/٣)
☐	غير متوفرة	☒	متوفرة	وجود مهزة للركام الصغير (٤/٤)
☒	غير متوفرة	☐	متوفرة	وجود مغسلة للركام الكبير (٢/٠)

الإضافات: (٦/٦)

☐	غير متحققة	☒	متحققة	حاويات الإضافات محكمة الغلق (١/١)
☐	غير متحققة	☒	متحققة	تغطية أماكن التشوينات بمظلات (٢/٢)
☐	غير كافية	☒	متحققة	لون الحاويات فاتح عاكس لأشعة الشمس (٢/٢)
☐	غير متوفر	☒	متحققة	وجود موتور للتقليب (١/١)

مياه الخلط: (٣/١)

☐	أخرى	☒	حكومي	مصدر مياه الخلط (١/١)
☒	استخدام ثلج	☐	وجود مبرد	طريقة تبريد الماء في حالة الحاجة (٢/٠)

الأسمنت: (٣/٣)

☐	واحدة فقط	☒	متوفرة (٣)	وجود أكثر من صومعة واحدة (١/١)
☐	غير متحققة	☒	متحقق	دهان الصوامع لون فاتح عاكس لأشعة الشمس (٢/٢)



٣٠٢٦/٤/٢٢

تلفون ۲۲۳۵۶۷۲۲ - (۰۲) ۲۲۳۵۶۸۵۳ / فاكس: ۲۲۳۵۱۵۶۴

